


新疆天泰纤维有限公司 1×252222 非厄伦古姆纤维项目环境影响评价

验收意见

2019年11月16日，新疆天泰纤维有限公司组织了“新疆天泰纤维有限公司

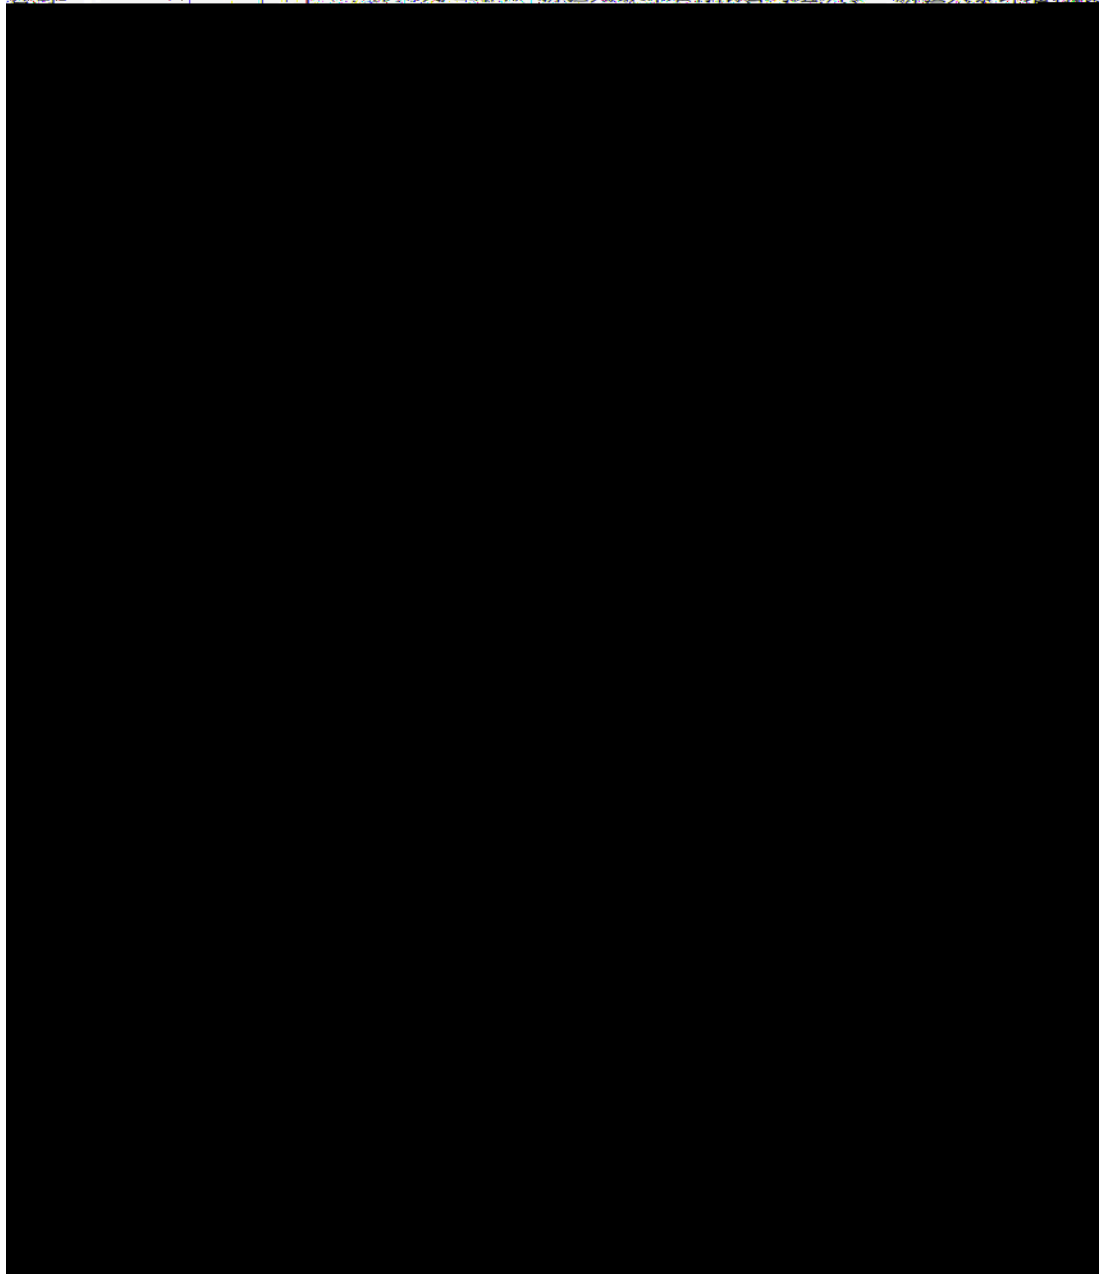

（三）投资情况

本项目实际总投资 3025 万元，环保投资 29 万元，占工程总投资的 0.96%。

（四）验收范围

项目环评文件及批复涉及内容。

二、工程变动情况

本项目不存在工艺、规模及治理设施变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目在新疆天泰纤维有限公司厂区内建设，劳动定员由新疆天泰纤维有限公司内部调剂解决，不产生新的生活用水和生活污水。项目废水主要为循环冷却排水，需经冷却后循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后，与生活污水一并用于厂区现有煤场喷淋及洒水。

（二）废气

本项目 1×35MW 抽背压式汽轮发电机组运行期间无废气产生。

（三）噪声

本项目噪声来自汽轮机、发电机、水泵等设备，源强 75~100 dB (A)。采用低噪设备，采取消声、门窗密闭等措施。

（四）固体废物

本项目固体废物主要为汽轮发电机产生的废机油，验收期间未产生，产生后送往新疆聚力环保科技有限公司进行无害化处理。

四、环保设施调试效果

（一）噪声

厂界四周昼间最大噪声值为 53 dB (A)，夜间最大噪声值为 46dB (A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准的要求 (昼间 65dB (A)、夜间 55dB (A))。

五、验收结论

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，本项目建设严格落实了环境影响评价报告表及批复要求，认真执行了环保“三同时”制度，污染物达标排放，项目建设符合竣工环保验收的要求，同意通过竣工环保验收。


六、后续要求

加强日常环境管理工作，加强职工环境保护教育，提高职工的环保意识，严格运营管理。

七、验收人员信息

具体见附表。

验收组组长：

验收组成员：

新疆天泰纤维有限公司

2019年1月25日
